


REVISIÓN DE OBLIGACIONES 180 DÍAS RADIODIFUSIÓN


“DELAZO TRANSITORIO”
EL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES
REVISARÁ DENTRO DE LOS
CIENTO OCHENTA DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A
SU RESOLUCIÓN LOS
TÍTULOS DE CONCESIÓN
DE SERVICIO DE RADIO
DIFUSIÓN
CUYO PLAZO DE VIGENCIA
EXPIRE EN EL AÑO
2000



1.- Estructura general del proyecto.


1.1- Estructura de estaciones sujetas a Revisión.

1610 títulos de concesión.

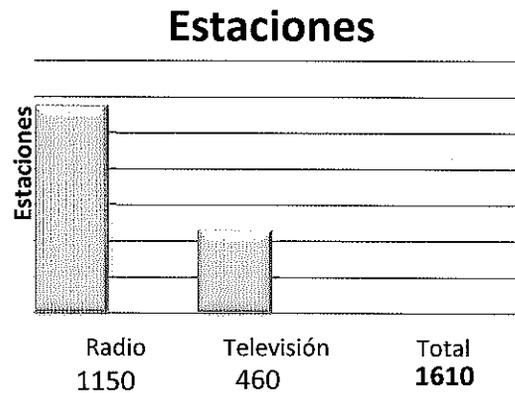

Fuente: Infraestructura de la Comisión 31/08/2013

**PROGRAMA DE REVISIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN
VIGENTES EN 180 DÍAS
NATURALES**



1.2.- Gestión de tiempo efectivo.

- Avance inicial 83 cédulas revisadas y capturadas
- Restante 1527 estaciones para revisar en 17 semanas

1.3.- Recursos Humanos Asignados.

- Personal asignado para revisión: 16 personas.

- Personal Tiempo Completo (9:00-18:00 hrs.): 4 personas
- Personal Sindicalizado Medio Tiempo (08:00-15:00 hrs.): 12 personas


1.4.- Resultados esperados.

- **Concluir a más tardar el 7 de febrero de 2014.**
 - **2 escenarios: óptimo y moderado**
 - Escenario óptimo: Concluye el 31 de enero de 2014
 - Escenario moderado: Concluye el 7 de febrero de 2014

1.5.- Reportes.


- Reporte semanal de avances para seguimiento y ajustes

PROGRAMA DE REVISIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN
VIGENTES EN 180 DÍAS
NATURALES



2.- Recursos Humanos Asignados

Unidad de Sistemas de Radio y Televisión	
Líder del Proyecto	
Supervisores	
Área de Revisión Legal	Área de Revisión Técnica
Revisores 8	Revisores 8
Personal Auxiliar	
Logística de Expedientes 3 Personas	Control y Captura 2 Personas
TOTAL 21 personas	



3.- Construcción de escenarios.

a.- Escenario óptimo.

100 expedientes revisados por semana

20 expedientes revisados diarios

16 semanas en total

Concluyendo el 31 de enero de 2014.

b.- Escenario moderado.

93 expedientes revisados por semana


18-19 expedientes revisados diarios

17 semanas en total

Concluyendo el 07 de febrero de 2014.


PROGRAMA DE REVISIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN
VIGENTES EN 180 DÍAS
NATURALES

4.- Descripción general del proceso.

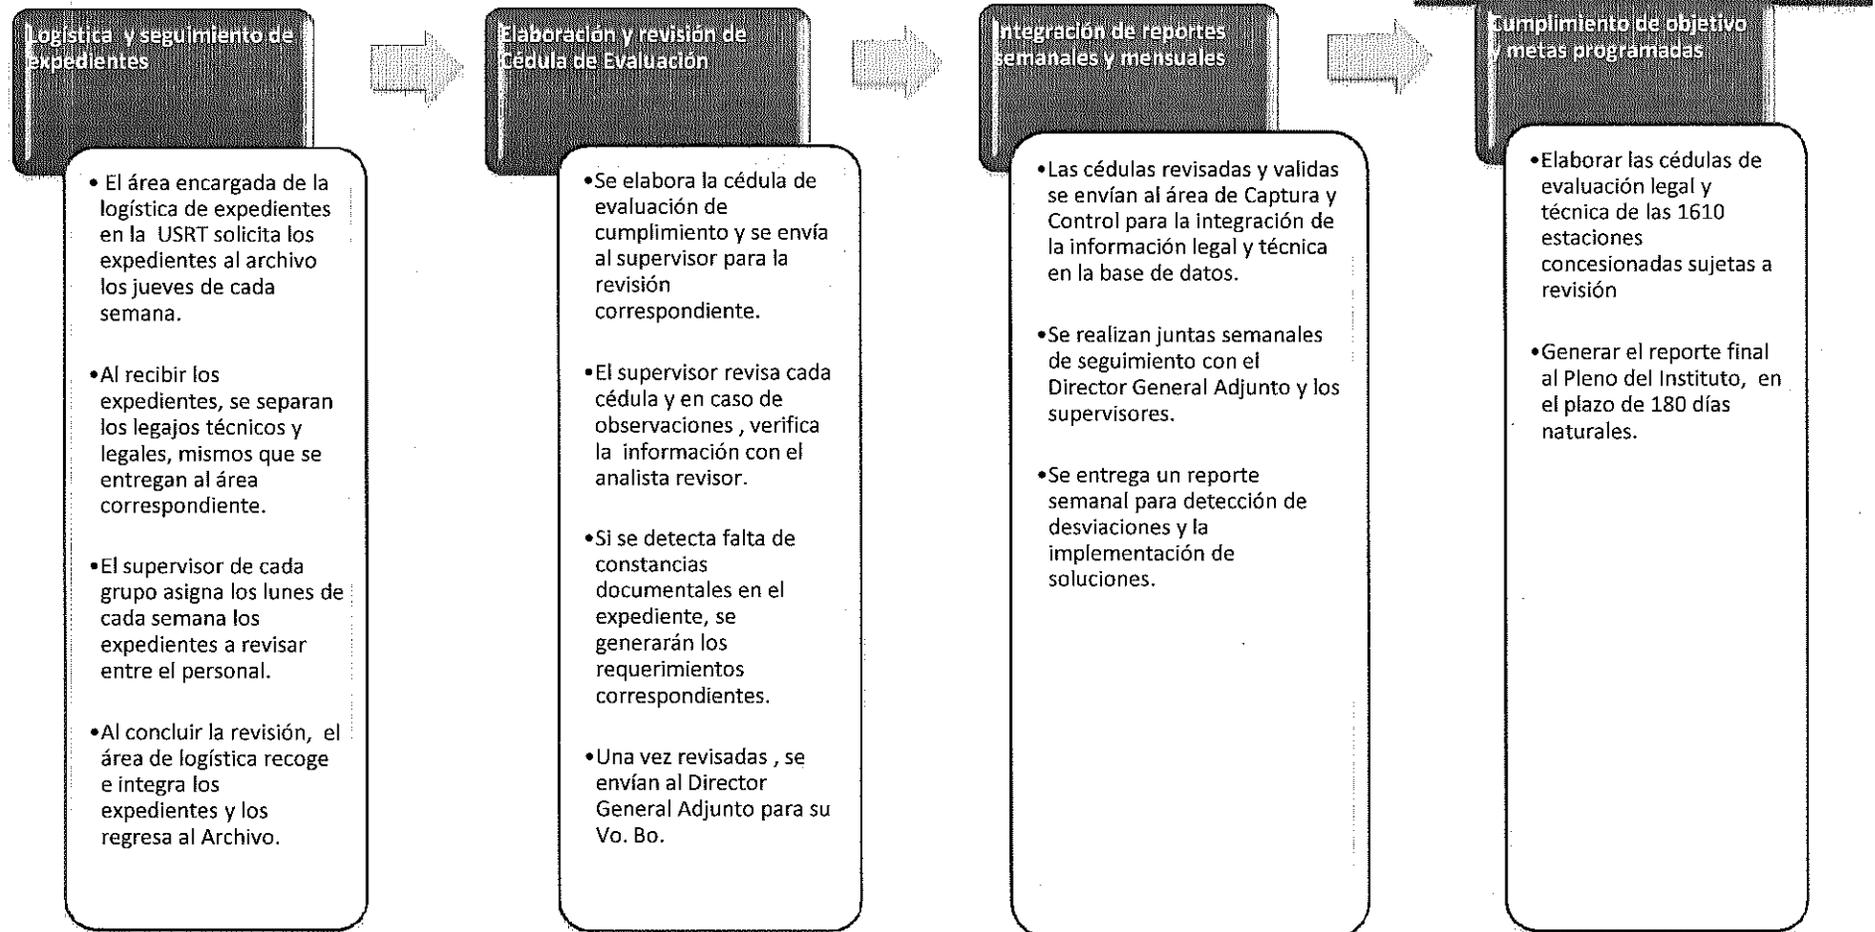




**PROGRAMA DE REVISIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN
VIGENTES EN 180 DÍAS
NATURALES**



5.- Programa Propuesto

- Fecha de Inicio: 1ª semana de octubre de 2013
- Fecha de término de revisión: 07 de febrero 2014
- Entrega del Informe de Consolidación: 28 de febrero de 2014


No.	Mes	Semanas	Meta Mínima (escenario moderado)	Meta Propuesta (escenario óptimo)
1	Septiembre	/	83 (revisiones anteriores)	83 (revisiones anteriores)
2	Octubre 01-11	2	133	133
3	Octubre 14-31	3	279	300
4	Noviembre	4	372	400
5	Diciembre	3	279	300
6	Enero	4	372	394
7	Febrero	1	92	-
Total		17	1610	1610




6.- Reporte Ejecutivo (5ta semana)


No.	Mes	Semanas	Meta Mínima (escenario moderado)	Meta Propuesta (escenario óptimo)	Realizados
1	Septiembre	/	83	83	83
2	Octubre 01-11	2	133	133	133
3	Octubre 14-31	3	279	300	299
4	Noviembre	4	372	400	
5	Diciembre	3	279	300	
6	Enero	4	372	394	
7	Febrero	1	92		
Total		17	1610	1610	515

Reporte Ejecutivo (5ta semana)




Proyección de Escenarios

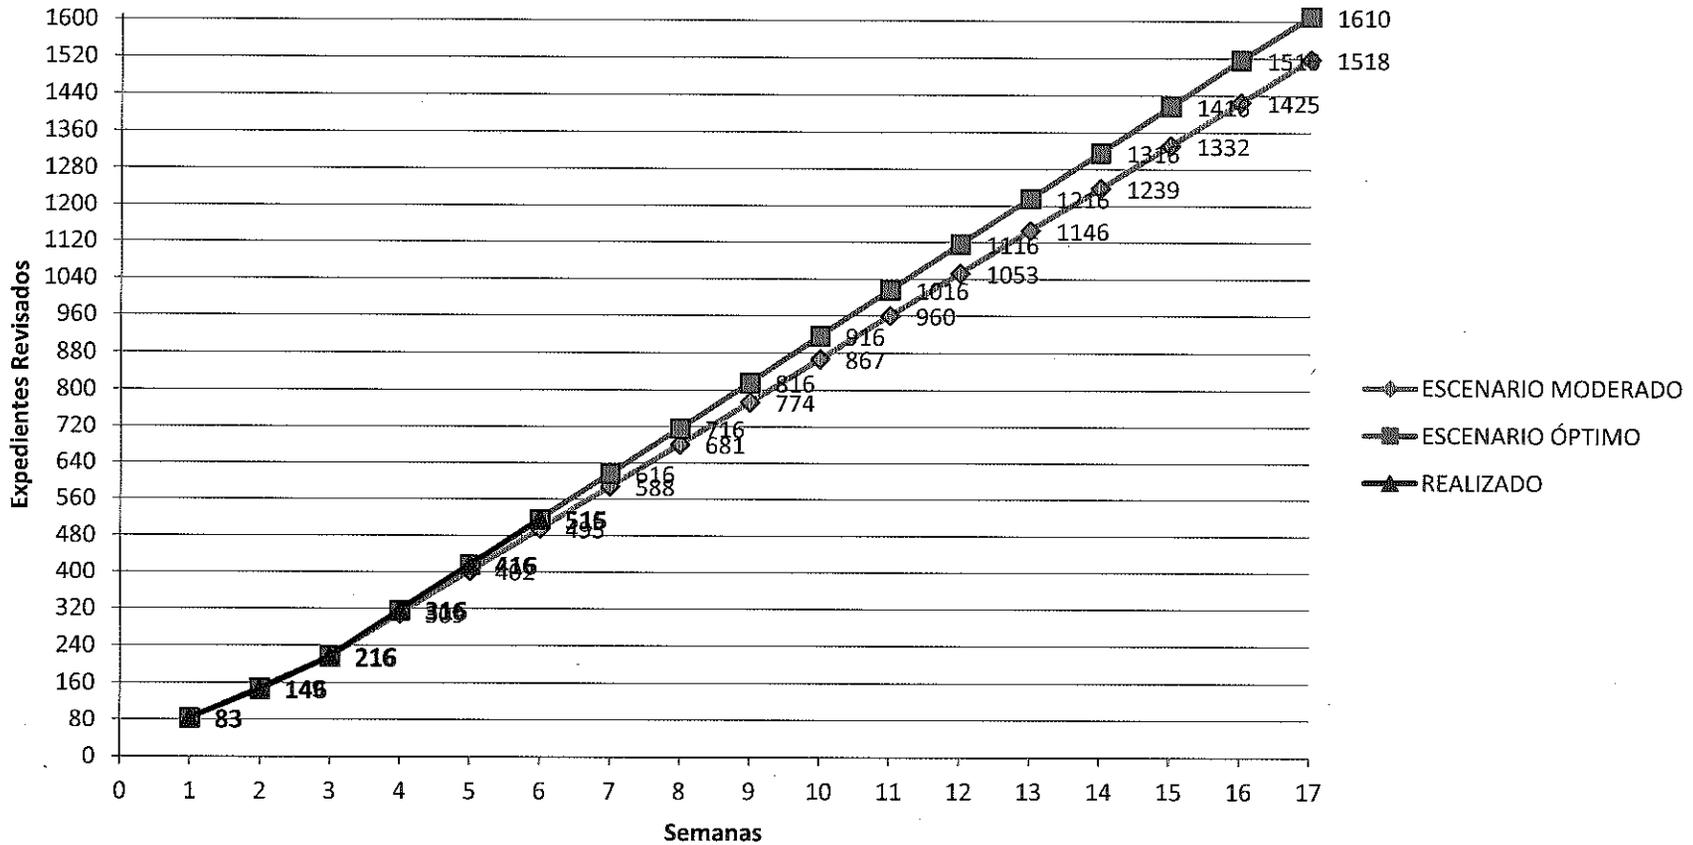




Reporte Ejecutivo (5ta semana)

Avance 5ta Semana

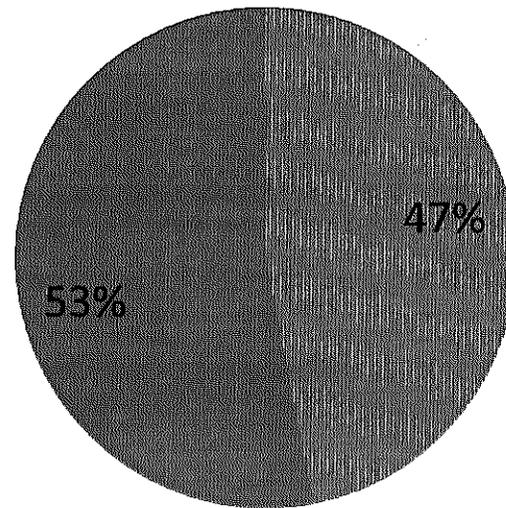

- REVISADOS
- POR REVISAR



7.- Reporte Final

- **Reporte de cédulas revisadas**
- **Casos identificados con documentación faltante**
- **Número de oficios de requerimientos emitidos**
- **Casos identificados en cumplimiento (posterior a revisión y requerimientos)**
- **Casos identificados en incumplimiento (posterior a requerimientos efectuados)**
