

# REVISIÓN DE OBLIGACIONES 180 DÍAS RADIODIFUSIÓN

*“OCTAVO TRANSITORIO.-  
EL INSTITUTO FEDERAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
REVISARÁ, DENTRO DE LOS  
CIENTO OCHENTA DÍAS  
NATURALES SIGUIENTES A  
SU INTEGRACIÓN, LOS  
TÍTULOS DE CONCESIÓN  
VIGENTES, A EFECTO DE  
VERIFICAR EL  
CUMPLIMIENTO DE SUS  
TÉRMINOS, CONDICIONES  
Y MODALIDADES.”*

# 1.- Estructura general del proyecto.

## 1.1- Estructura de estaciones sujetas a Revisión.

- 1610 títulos de concesión.



Fuente: Infraestructura de la Comisión 31/08/2013

**1.2.- Gestión de tiempo efectivo.**

- Avance inicial 83 cédulas revisadas y capturadas
- Restante 1527 estaciones para revisar en 17 semanas

**1.3.- Recursos Humanos Asignados.**

**- Personal asignado para revisión: 16 personas.**

- Personal Tiempo Completo (9:00-18:00 hrs.): 4 personas
- Personal Sindicalizado Medio Tiempo (08:00-15:00 hrs.): 12 personas

**1.4.- Resultados esperados.**

- **Concluir a más tardar el 7 de febrero de 2014.**
  - **2 escenarios:** óptimo y moderado
  - Escenario óptimo: Concluye el 31 de enero de 2014
  - Escenario moderado: Concluye el 7 de febrero de 2014

**1.5.- Reportes.**

- Reporte semanal de avances para seguimiento y ajustes

## 2.- Recursos Humanos Asignados

Unidad de Sistemas de Radio y Televisión	
<b>Líder del Proyecto</b>	
<b>Supervisores</b>	
<b>Área de Revisión Legal</b>	<b>Área de Revisión Técnica</b>
<b>Revisores 8</b>	<b>Revisores 8</b>
<b>Personal Auxiliar</b>	
<b>Logística de Expedientes</b>	<b>Control y Captura</b>
<b>3 Personas</b>	<b>2 Personas</b>
<b>TOTAL 21 personas</b>	

### 3.- Construcción de escenarios.

**a.- Escenario óptimo.**

**100 expedientes revisados por semana**

20 expedientes revisados diarios

16 semanas en total

**Concluyendo el 31 de enero de 2014.**

**b.- Escenario moderado.**


**93 expedientes revisados por semana**

18-19 expedientes revisados diarios

17 semanas en total

**Concluyendo el 07 de febrero de 2014.**

## 4.- Descripción general del proceso.

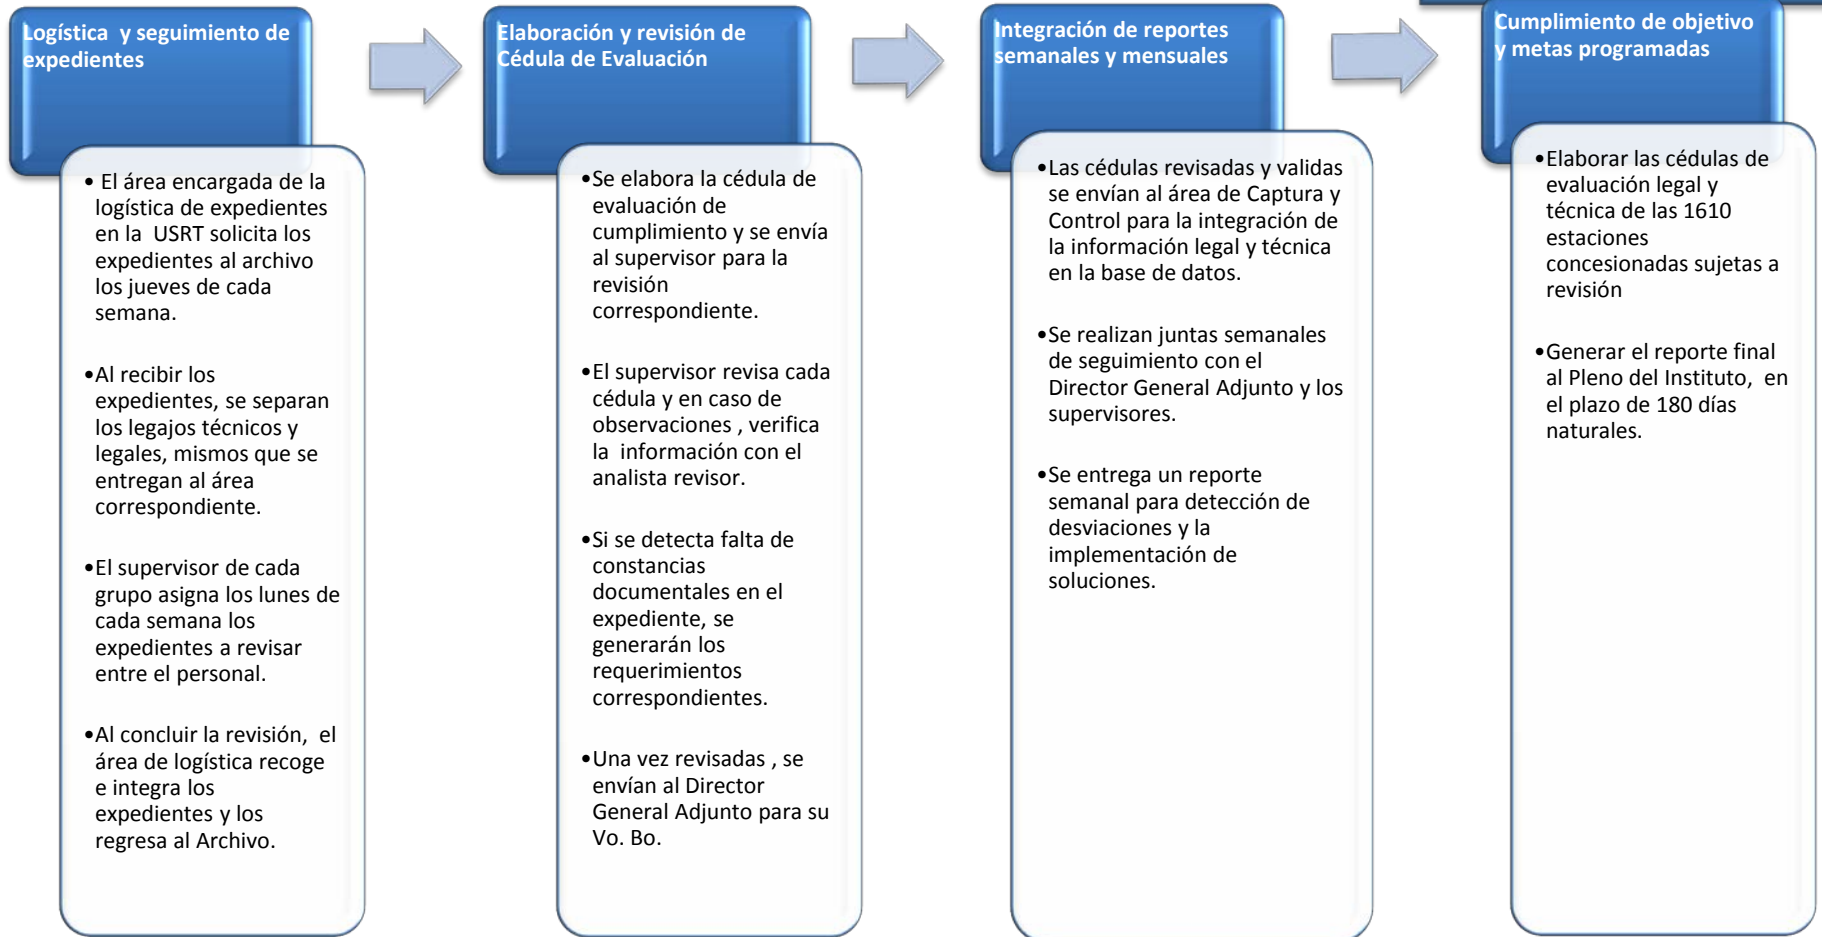

## 5.- Programa Propuesto

- Fecha de Inicio: 1ª semana de octubre de 2013
- Fecha de término de revisión: 07 de febrero 2014
- Entrega del Informe de Consolidación: 28 de febrero de 2014

No.	Mes	Semanas	Meta Mínima (escenario moderado)	Meta Propuesta (escenario óptimo)
1	Septiembre	/	83 (revisiones anteriores)	83 (revisiones anteriores)
2	Octubre 01-11	2	133	133
3	Octubre 14-31	3	279	300
4	Noviembre	4	372	400
5	Diciembre	3	279	300
6	Enero	4	372	394
7	Febrero	1	92	-
<b>Total</b>		17	1610	1610


## 6.- Reporte Ejecutivo (5ta semana)

No.	Mes	Semanas	Meta Mínima (escenario moderado)	Meta Propuesta (escenario óptimo)	Realizados
1	Septiembre	/	83	83	83
2	Octubre 01-11	2	133	133	133
3	Octubre 14-31	3	279	300	299
4	Noviembre	4	372	400	
5	Diciembre	3	279	300	
6	Enero	4	372	394	
7	Febrero	1	92	-	
<b>Total</b>		17	1610	1610	515




# Reporte Ejecutivo (5ta semana)

## Proyección de Escenarios

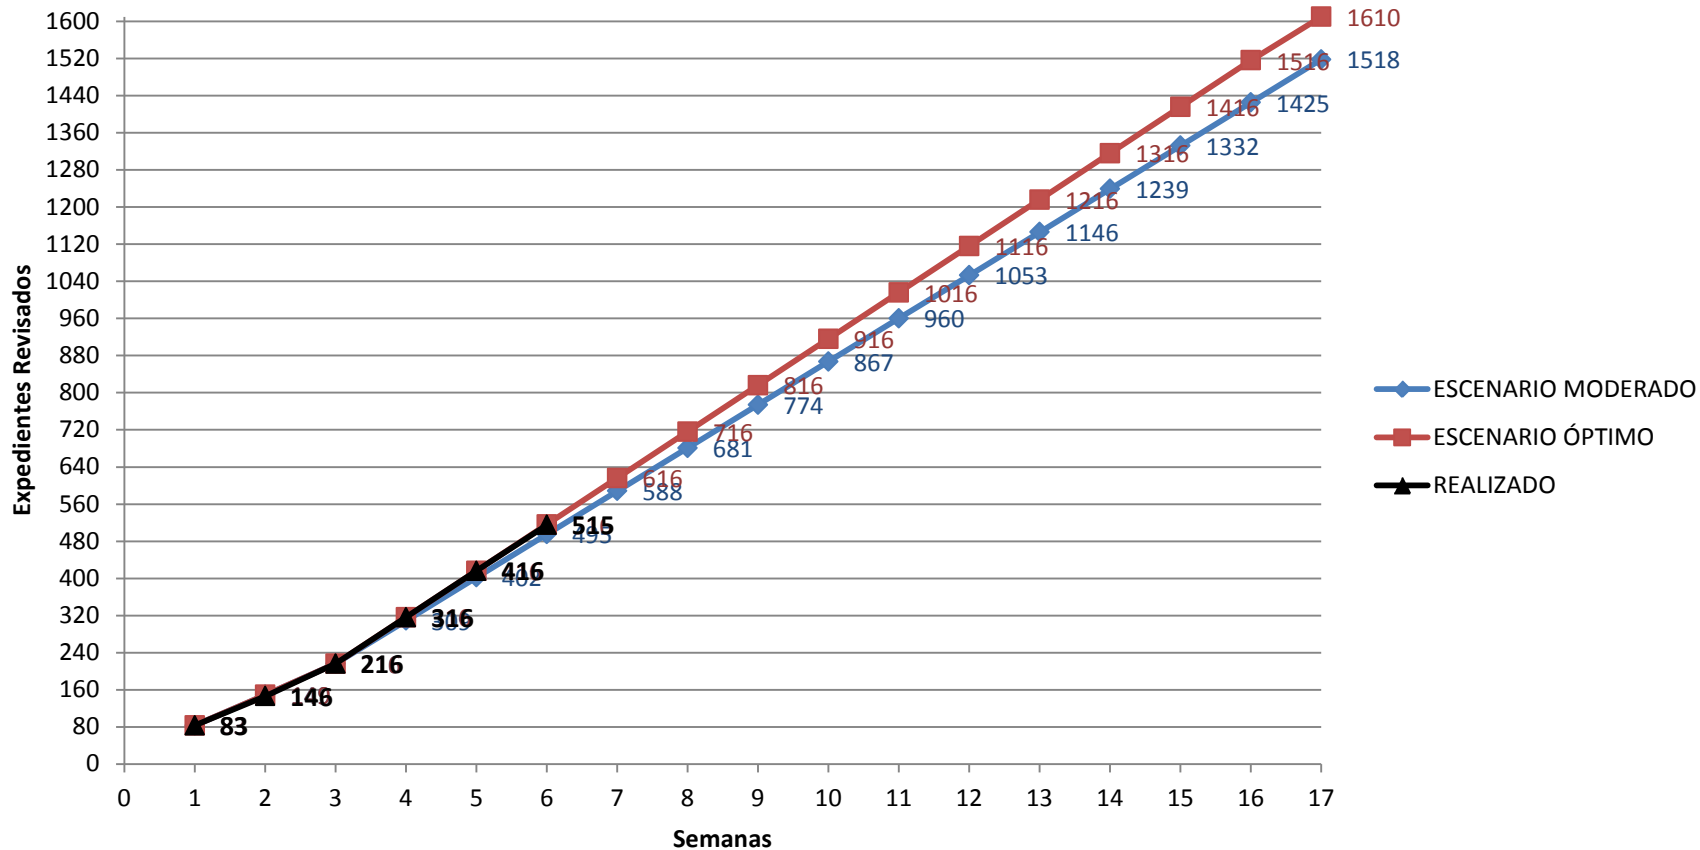


## Reporte Ejecutivo (5ta semana)

### Avance 5ta Semana

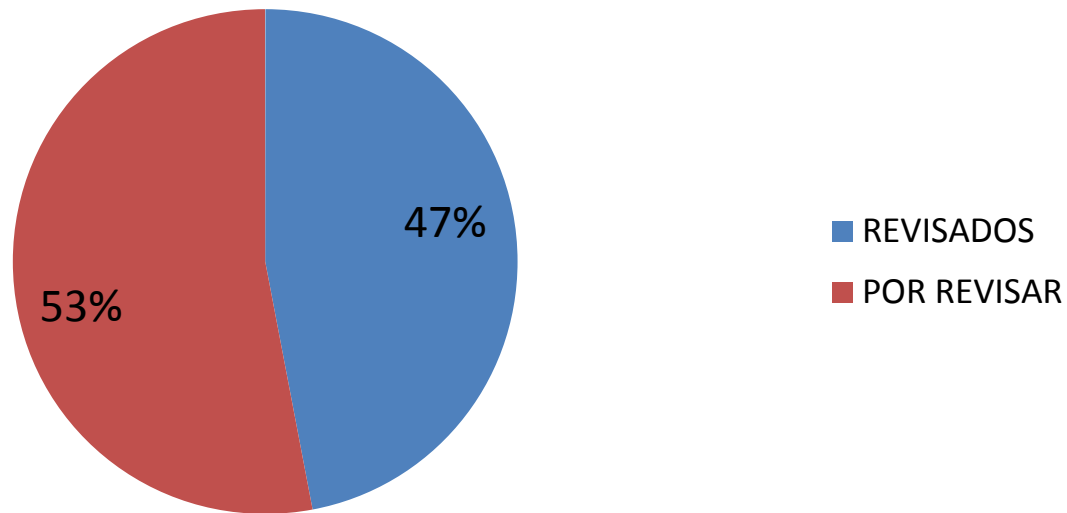

## 7.- Reporte Final

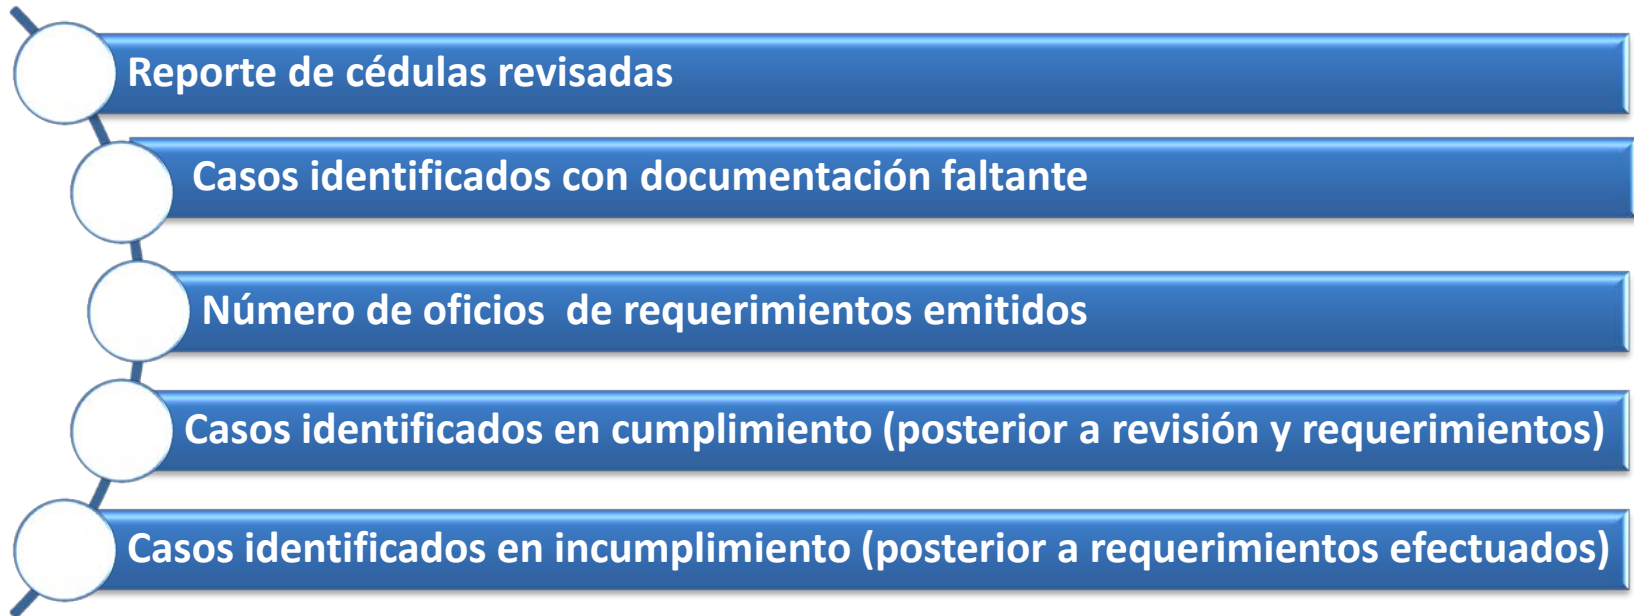- 
- Reporte de cédulas revisadas
  - Casos identificados con documentación faltante
  - Número de oficios de requerimientos emitidos
  - Casos identificados en cumplimiento (posterior a revisión y requerimientos)
  - Casos identificados en incumplimiento (posterior a requerimientos efectuados)
