

REVISIÓN DE OBLIGACIONES 180 DÍAS

*“OCTAVO TRANSITORIO.-
EL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES
REVISARÁ, DENTRO DE LOS
CIENTO OCHENTA DÍAS
NATURALES SIGUIENTES A
SU INTEGRACIÓN, LOS
TÍTULOS DE CONCESIÓN
VIGENTES, A EFECTO DE
VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
TÉRMINOS, CONDICIONES
Y MODALIDADES.”*

Estructura general del proyecto.

1.- Grupos de Trabajo.

- Grupo extraordinario de **48 personas**.
- Integrado por **DGS, DGV y RENAR**.
- Conformación de **6 grupos. 8 personas c/u**

2.- Universo de revisión.

- **2,565 títulos de concesión**.
- Al 7 de octubre se habían revisado 235 títulos
- El total de títulos renunciados es de 175.

3.- Resultados esperados.

- **Concluir a más tardar 14 de febrero 2014**.
- **3 escenarios:** óptimo, medio y adverso
- En los 3 se cumple antes del 14 de febrero

4.- Seguimiento y reportes.

- **Supervisión diaria del proceso.** 6 supervisores.
- Reporte semanal para ajustes.
- Reporte ejecutivo quincenal al Pleno.

**PROGRAMA DE REVISIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN
VIGENTES EN 180 DÍAS
NATURALES**

EQUIPOS DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN					
COORDINADOR DE EQUIPOS					
Miguel Ángel Monroy Rodríguez					
SUPERVISORES DE EQUIPOS					
Naghive Jacobo Soler	Juan Manuel Duran	Eusebio Rubio Rangel	Ana Laura González	Jorge Alberto López	Raúl Espinosa
Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3	Equipo 4	Equipo 5	Equipo 6
Víctor Valdés Cruz <i>(DGS)</i>	Jessica Álvarez Blancas <i>(DGS)</i>	Daniel Puera Ávila <i>(Servicio social)</i>	Enrique Villalobos Zavala <i>(Verificación)</i>	Antonio Rodríguez Contreras <i>(Verificación)</i>	Martha Barrera Quintero <i>(RENAR)</i>
Arturo Castro Flores <i>(DGS)</i>	Ana Karen Celis Quijano <i>(DGS)</i>	Epigmenio Martínez Bejarano <i>(RENAR)</i>	Martin Valdovinos Soreque <i>(Verificación)</i>	Saraí Segura Sánchez <i>(Verificación)</i>	Francisco Javier Espinosa de la Cruz <i>(RENAR)</i>
Juana María Alvarado Cárdenas <i>(DGS)</i>	Lourdes Margarita Santaolalla <i>(DGS)</i>	Margarito Sánchez Chino <i>(RENAR)</i>	Agustina Vázquez Salinas <i>(Verificación)</i>	Paz Flores Fuentes <i>(Verificación)</i>	David Hernández Linares <i>(RENAR)</i>
Jesús Eduardo Cárdenas Ávila <i>(DGS)</i>	Edmundo Rojas Palancares <i>(DGS)</i>	Mario Díaz Nieto <i>(RENAR)</i>	Rolando Ávila Hernández <i>(Verificación)</i>	Lino Acosta Bautista <i>(Verificación)</i>	Fernando Ramírez Suárez <i>(RENAR)</i>
Alix Pamela Manzanares Núñez <i>(DGS)</i>	Gabriela Ibarra Dávila <i>(DGS)</i>	José Luis Ordaz Vergara <i>(RENAR)</i>	Jesús Ignacio Espinosa de La Cruz <i>(Verificación)</i>	Ruben Olmedo Delgadillo <i>(Verificación)</i>	Pablo Santos Ramírez <i>(RENAR)</i>
Rodrigo Sánchez Reyna <i>(DGS)</i>	Jessica Elizabeth Vera Sandoval <i>(DGS)</i>	Rosa Elvira Bernabe Sánchez <i>(RENAR)</i>	Ismael Avila Hernández <i>(Verificación)</i>	Ezequiel Villalobos Calderas <i>(Verificación)</i>	Adriana Bermudez Alba <i>(RENAR)</i>
Rodrigo Bugarin Pulido <i>(Servicio social)</i>	Myriam Amador Martínez <i>(DGS)</i>	Leticia Buendía Morales <i>(RENAR)</i>	Alfonso Azpeitia Osorio <i>(Verificación)</i>	Gabriel Dominguez Dominguez <i>(Verificación)</i>	Oscar Luna Alonso <i>(RENAR)</i>
Julio César Rojas Bustos <i>(Servicio social)</i>	Erik Agustín Martínez <i>(Servicio social)</i>	Lenin Contreras Cruz <i>(Verificación)</i>	Arturo Godinez Sánchez <i>(Verificación)</i>	Ismael Martinez Salazar <i>(Verificación)</i>	Juan Andres Figueroa <i>(RENAR)</i>
8	8	8	8	8	8
TOTAL 48 personas					

2.- Construcción de escenarios.

a.- Escenario óptimo.

1 título x persona diario.

240 títulos x semana

9 semanas en total

Concluyendo el 6 de diciembre de 2013.

b.- Escenario intermedio.

2 títulos x persona cada 3 días

180 títulos x semana

12 semanas en total

Concluyendo el 13 de enero de 2014.

c.- Escenario adverso.

1 título x persona cada 2 días

120 títulos x semana

18 semanas en total

Concluyendo el 13 de febrero de 2014.

3.- Descripción general del proceso.

Asignación y seguimiento de expedientes

- La CGOTI entregará los lunes de cada semana los expedientes que hayan sido solicitados el jueves previo.
- La CGOTI recogerá los expedientes que hayan sido trabajados en la semana previa.
- El supervisor de cada grupo asignará los lunes de cada semana los expedientes a revisar.

Integración de ficha y validación por supervisor

- El supervisor recibirá a diario la ficha que en su caso se haya elaborado por cada persona la cual deberá estar firmada.
- El supervisor revisará cada ficha y la firmará de revisado, enviándola al coordinador.
- Se generarán a la par requerimientos a los operadores en caso de detectar omisiones.

Integración de reportes semanales y mensuales

- El coordinador general deberá autorizar todas las fichas revisadas por los supervisores, las cuales se integrarán en una base de datos.
- Semanalmente se integrará un reporte para detección de desviaciones y la implementación de soluciones.
- Quincenalmente se informará al Pleno de los avances del proyecto y cualquier observación importante.

Cumplimiento de objetivo y metas programadas

- Generar 2,565 fichas de revisión del cumplimiento de obligaciones.
- Se practicarán visitas de verificación a todos los operadores representativos y al resto de manera aleatoria.
- Procurar cumplir inclusive antes del 14 de febrero (Escenario óptimo e intermedio).
- Generar el reporte final al Pleno del Instituto, el cual se hará publico a más tardar en el plazo de 180 días naturales.

4.- Visitas de verificación.

Metodología

- A partir del mes de noviembre de 2013, se practicarán visitas de verificación a los operadores más representativos en función del número de usuarios (95.6%)
- El resto de los operadores se verificarán de manera aleatoria (4.23%)
- Lo anterior en función de usuarios quedaría representado de la siguiente manera:


4.- Visitas de verificación.

SUSCRIPCIONES TOTALES POR SERVICIO		
Servicio	Total de suscripciones	Operadores (+)
Servicio móvil (74.7%)	102'614,320	Telcel (70%) GTM (19%) Grupo Iusa (7%) Nextel (4%)
Servicio fijo (14.8%)	20'346,630	Telmex (67%) Axtel (9%) Televisa (7.6%) Otros (15.9%)
Servicio de televisión restringida (10.4%)	14'388,967	Televisa (53%) MVS/DISH (14.5%) Megacable (14.3%) Otros (17.9%)
GRAN TOTAL	137'349,917	100%

4.- Visitas de verificación.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS OPERADORES POR SERVICIO JUNIO 2013


CONFIDENCIAL

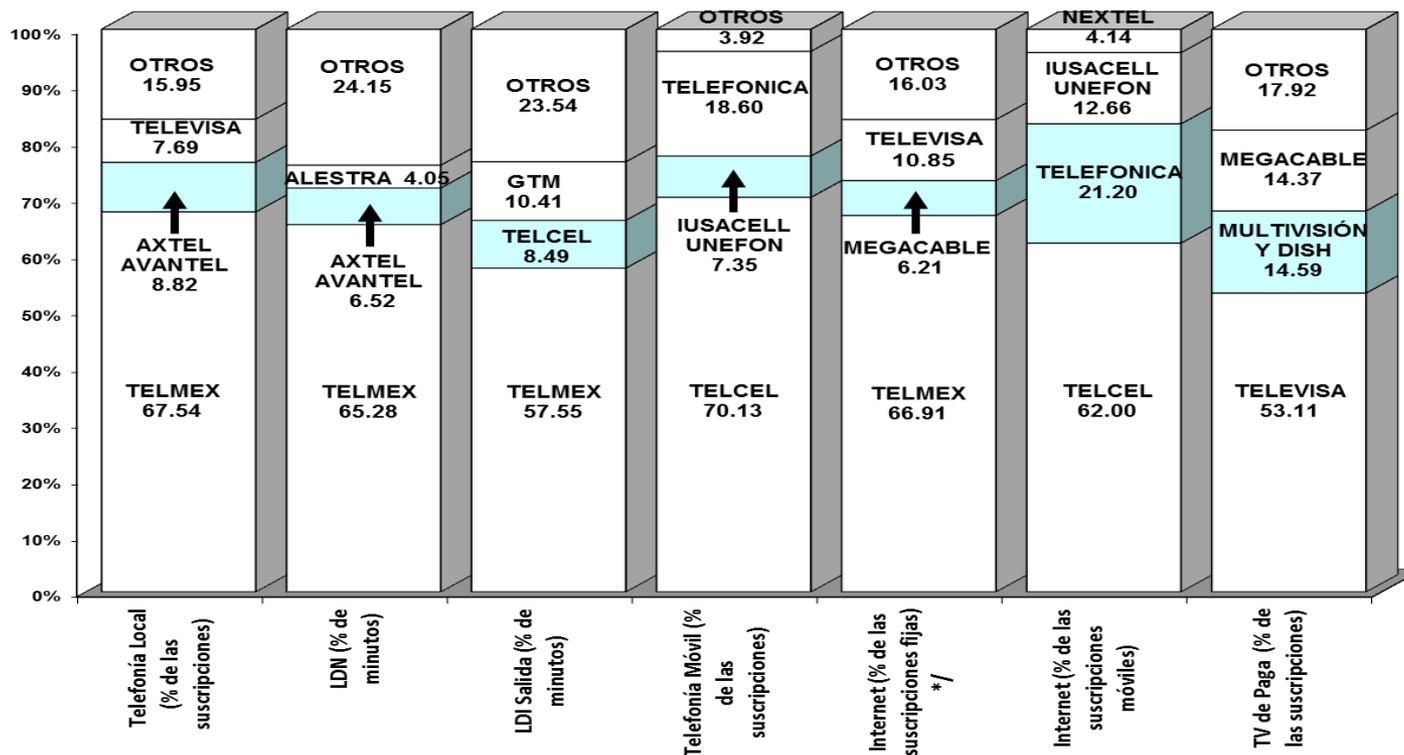

Notas: Larga Distancia Nacional (LDN) y Larga Distancia Internacional de Salida (LDI Salida):
acumulado enero-junio de 2013.

FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados.

4.- Visitas de verificación.

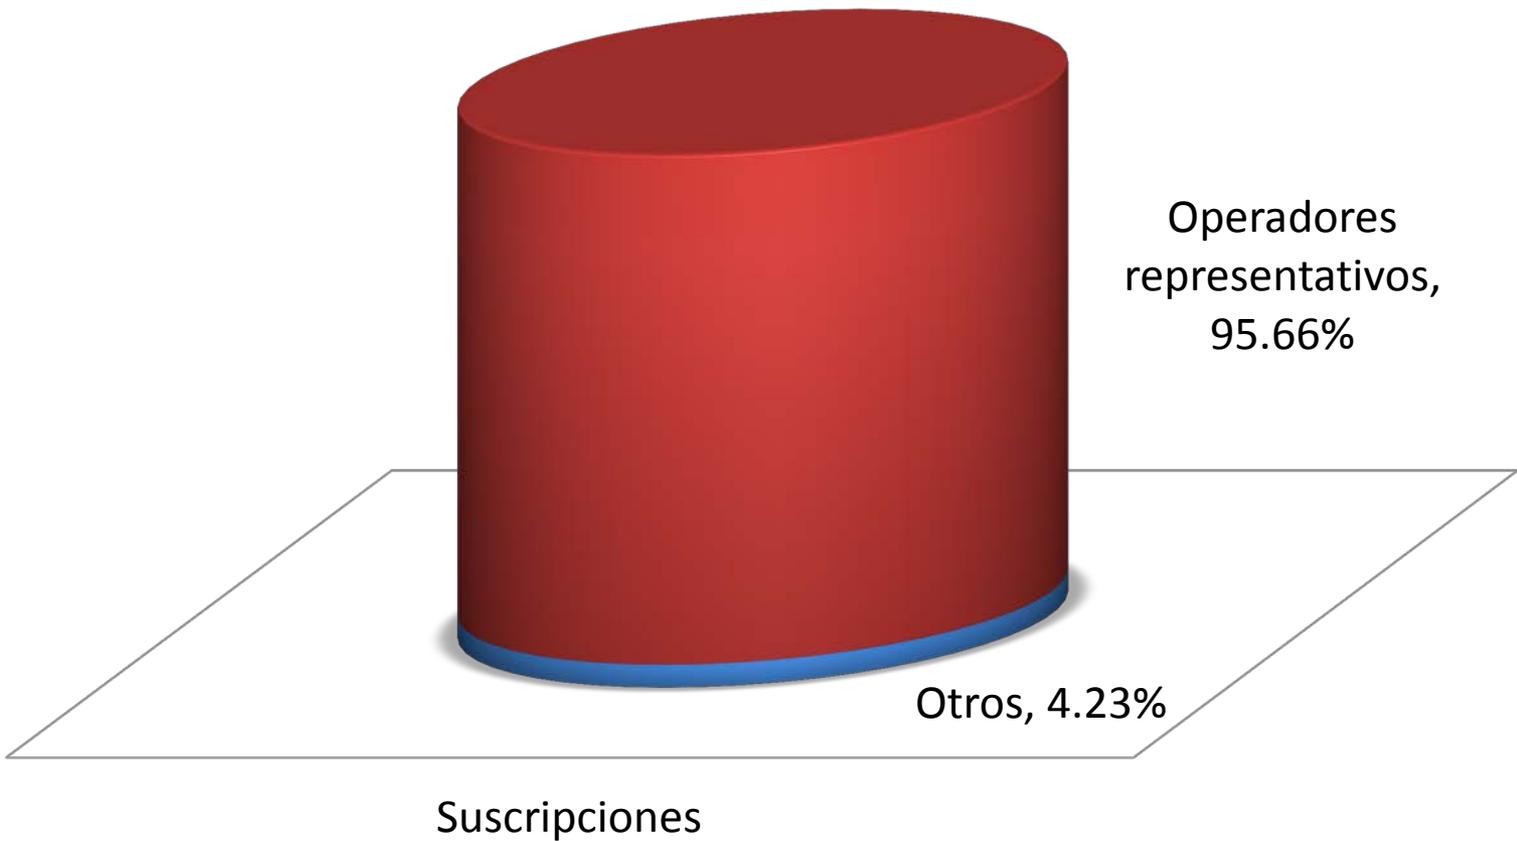


4.- Visitas de verificación.

Concesionarios más representativos (Más área de cobertura y más usuarios)		Servicio
02 y 07. RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES. VIDEO Y AUDIO RESTRINGIDO POR CABLE.		
02/0053	Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	Red pública de telecomunicaciones
07/0017	Mega Cable, S.A. de C.V.	Red pública de telecomunicaciones
Total		2
19 TELEVISIÓN RESTRINGIDA (MMDS Y SATELITAL)		
19/0669	Corporativo Novavisión, S. de R.L. de C.V. (SKY)	TV (Satelital)
19/0740	COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S.A. DE C.V. (DISH)	TV (Satelital)
Total		2
312.045 REDES DE TELECOMUNICACIONES INTERESTATALES (LARGA DISTANCIA Y LOCAL)		
312.045 / 0010	Teléfonos de México, S.A. de C.V.	Telefonía básica de Larga Distancia nacional e Internacional
312.045 / 0022	Axtel, S.A.B. de C.V.	Telefonía básica de Larga Distancia nacional e Internacional
Total		2
312.045 REDES DE TELECOMUNICACIONES INTERESTATALES (ACCESO INALÁMBRICO FIJO O MÓVIL)		
312.045 / 0041	Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V.	Acceso inalámbrico fijo o movíl. Regiones PCS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
312.045 / 0043	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	Acceso inalámbrico fijo o movíl. Regiones PCS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Total		2
321.4 RADIOCOMUNICACIÓN ESPECIALIZADA EN FLOTILLAS (TRUNKING)		
321.4 / 121	NII telecom, S. de R.L. de C.V.	Trunking
Total		1
321.5 TELEFONÍA CELULAR		
321.5 / 0006	Portatel del Sureste, S.A. de C.V.	Anexo inalámbrico fijo o móvil. Telefonía celular
Total		1

6.- Reporte Ejecutivo (4a semana)

SEMANA	ESCENARIO IDEAL	ESCENARIO INTERMEDIO	ESCENARIO BAJO	REALIZADO
ACUMULADO AL 7 OCTUBRE 2013	410	410	410	410
1ª	240	180	120	175
2ª	240	180	120	349
3ª	240	180	120	399
4ª	240	180	120	289
5ª	240	180	120	
6ª	240	180	120	
7ª	240	180	120	
8ª	240	180	120	
9ª	235	180	120	
10ª		180	120	
11ª		180	120	
12ª		175	120	
13ª			120	
14ª			120	
15ª			120	
16ª			120	
17ª			120	
18ª			115	
TOTAL	2565	2565	2565	1622

6.- Reporte Ejecutivo (4a semana)

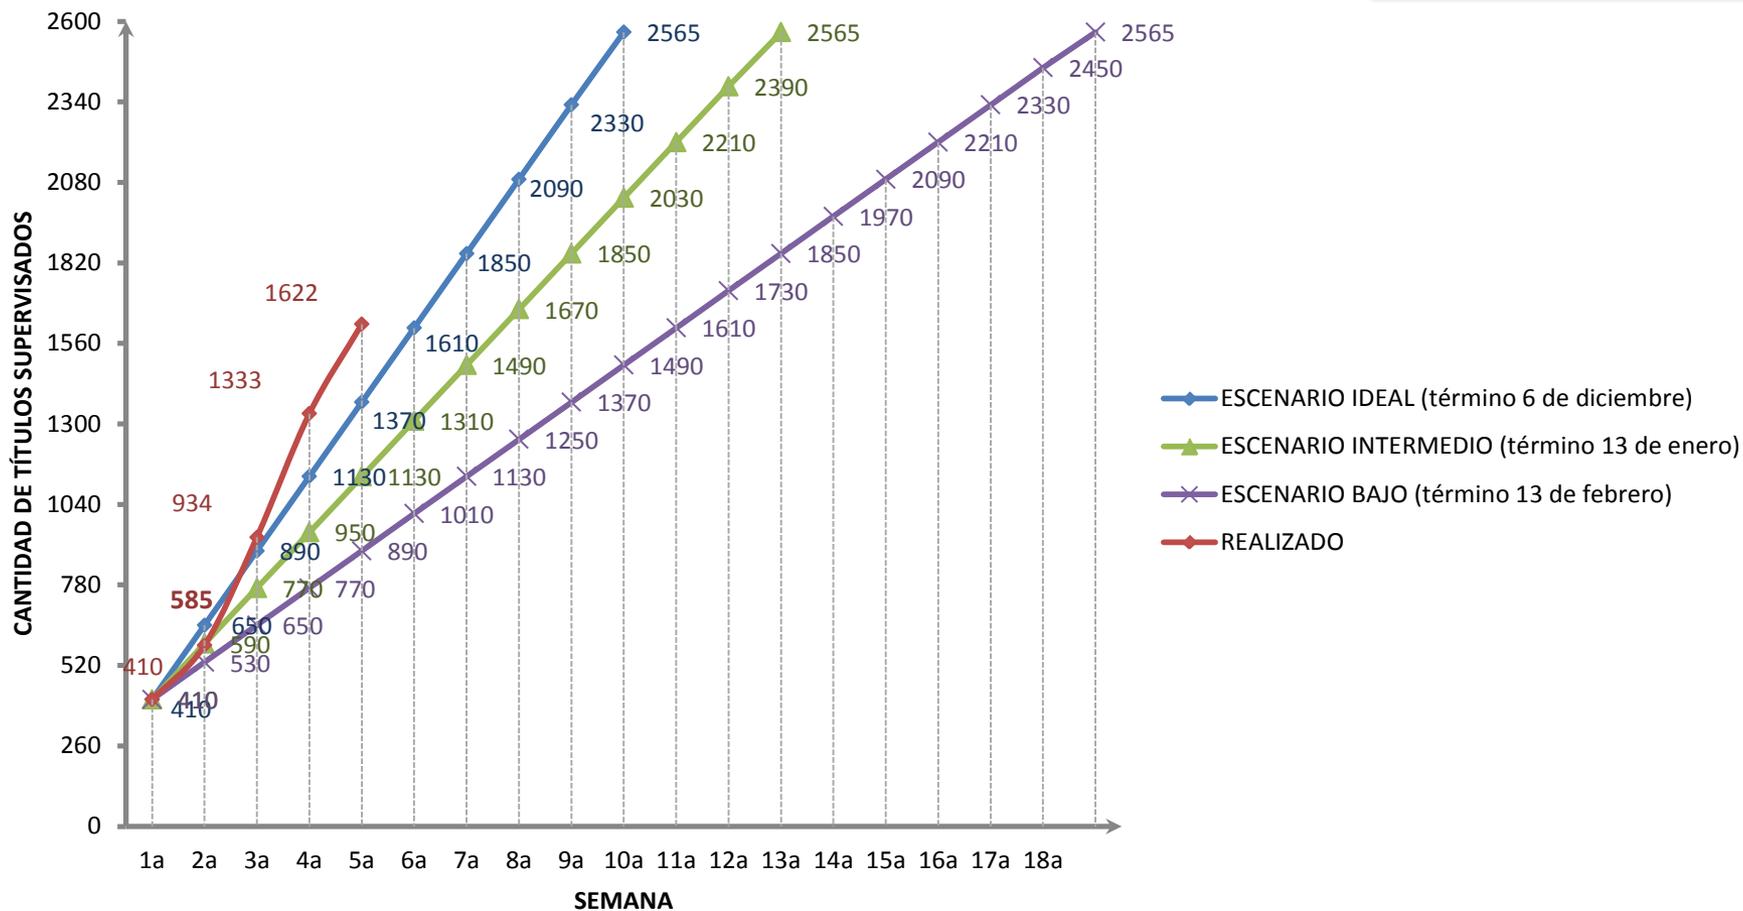

6.- Reporte Ejecutivo (4a semana)

% de avance de supervisión

